

令和5年度伊達市事務事業評価シート

1 事務事業について

事務事業名 (予算書上事業名)	01	都市公園施設改築事業 (都市公園安全・安心対策事業)					作成日	令和5年8月9日
基本目標	04	安心・安全で住み良いまちづくり					所管部署	建設 部
分野別施策	01	まちの整理・整頓と機能的なまちづくり						上下水道 課
必要取組	03	市民ニーズに適した公園・緑地の整備					事業開始年度	R3
補助/単独	補助	経費区分	政策	新規/継続	継続	重点施策	非該当	事業終了(予定)年度
会計区分	01	一般会計			SDGs の取組	①	03	すべての人に健康と福祉を
款	08	土木費				②	11	住み続けられるまちづくりを
項	04	都市計画費				③	12	つくる責任つかう責任
予算科目	目	02 公園緑化費			個別計画・根拠法令	公園長寿命化計画		
対象	公園利用者					目的 幅広い年齢層の市民が快適かつ安全に利用できる公園 の整備を図るため、公園施設の更新を行う。		
概要	手 段 耐用年数の超過や、遊具点検により危険と判断された公園施設をライフサイクルコストを勘案して計画的に更新を行う。							

2 投入経費の実績と計画

単位：千円

投入経費	R2	R3	R4	R5	R6	R7
	(決算額)	(決算額)	(決算額)	(予算額)	(計画値)	(計画値)
直接事業費(A)		35,200	23,518	33,100	40,000	
国・道支出金		17,500	11,500	16,000	20,000	
地方債						
その他						
一般財源	0	17,700	12,018	17,100	20,000	0
最終予算額(補正予算を含む)		35,200	23,518	33,100		
執行率	#DIV/0!	100.0%	100.0%	100.0%		
参考人件費(B)	0	1,895	1,894	1,939	1,939	0
うち一般職員	0	1,144	1,143	1,188	1,188	0
投入人員[人]	0.00	0.20	0.20	0.20	0.20	0.00
うち会計年度任用職員	0	751	751	751	751	0
投入人員[人]	0.00	0.30	0.30	0.30	0.30	0.00
投入経費合計(C = A + B)	0	37,095	25,412	35,039	41,939	0
人件費比率(D = B / C)	#DIV/0!	5.1%	7.5%	5.5%	4.6%	#DIV/0!

3 事務事業に対する指標の実績値と目標値

活動指標(アウトプット) 【事業の実施結果】		単位	R2	R3	R4	R4	R5	R6	R7
			実績値	実績値	目標値	実績値	目標値	目標値	目標値
①	公園施設整備数	施設		8	8	8	4	28	
②									
③									
指標の設定根拠 (指標の算式)		①	公園長寿命化計画に基づき整備した公園施設数						
		②							
		③							
成果指標(アウトカム) 【事業実施によって得られた効果】		単位	R2	R3	R4	R4	R5	R6	R7
			実績値	実績値	目標値	実績値	目標値	目標値	目標値
①	整備進捗率			16.7	33.3	33.3	41.7	100	
②									
③									
指標の設定根拠 (指標の算式)		①	R3~R6における更新予定数(48施設)に対する進捗率						
		②							
		③							

4 所管課による観点別評価(一次評価)

観点	評価	評価の理由
妥当性	3	市で管理している公園施設であり、老朽化や不具合のある施設を更新するのは市の役割である。 3:妥当である 2:検討の余地がある 1:改善が必要
有効性	2	遊具等の単価上昇により、最終年は全ての予定施設の更新ができない可能性がある。 3:単年度及び中長期の目標値を達成可能 2:単年度のみ達成 1:達成できない
効率性	3	価格調査を行っており、国の基準で工事価格を策定しているためコスト削減の余地はない。 補助事業を活用しているため、市の負担は適正である。 3:適正である 2:検討の余地がある 1:改善が必要

5 所管課による事業の方向性評価（一次評価）

【成果・コストからみる事業の方向性】

成果	拡充	維持	縮小	休廃止	完了
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
コスト	拡大	維持	縮小	皆減	完了
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

所管課による 事業の方向性評価	B
--------------------	----------

【事業の方向性評価の基準】

A【拡充】	成果向上のため事業の対象・目標・内容等を拡充・充実すべきもの
B【維持】	事業の対象・目標・内容等が適切で、事業の実施を維持すべきもの
C【要改善】	事業の対象・目標・内容等が適切でなく、見直し(縮小)の必要があるもの
D【完了または廃止】	事業完了または事業の廃止を検討するもの

事業の方向性評価の理由

遊具点検で危険と判断したものは使用禁止にしているが、市民からいつ使用できるか等の問い合わせがあり、市民からの更新要望があることから、今後も更新事業を実施すべきと考えている。

【事業の課題、改善策】

事業の課題やそれに対する具体的な改善策（次年度予算による取組、コスト削減方法 等）

課題	前年度（R4）の事業実施の中で表れた課題	
	様々な要因から遊具の価格が上昇しており、遊具の選定に苦慮している。	
改善策	課題に対する今年度（R5）の改善策	課題に対する次年度（R6）以降の改善策
	早めに価格調査を行い、予算内で更新可能な遊具を選定する。	価格上昇により予定していた遊具全ての更新ができないと想定されるので、次回更新計画の見直しを図る。
効果等	改善により見込まれる効果、負担を求める場合の住民に対するフォロー	
	更新計画の見直しにより、より精度の高い更新時期を市民にお知らせできる。	
実施結果	今年度の改善策の実施結果	次年度(R6)以降の事業実施に向けた改善策の見直し
	1 2 公園で遊具の更新を行うことができた。	施設整備計画を見直し、R6年度の遊具更新を 1 3 公園に増やした。

【事業の方向性評価の目安】

事業の方向性	拡充			A,B	A	A,C
	維持			B,C	B	C
	縮小			B,C	C	C,D
	休廃止		D			
	完了	D				
		完了	皆減	縮小	維持	拡大

コスト投入の方向性

6 事務事業評価会議による二次評価と今後の方向性


【観点別評価】

観点	妥当性	有効性	効率性
一次評価	3	2	3
二次評価	3	2	3

【観点別評価に対するコメント】

妥当性	市の関与または実施主体は妥当である。また、対象（受益者）や目的についても妥当である。
有効性	成果指標については、概ね妥当である。また、上位施策が掲げる目標には直接的に寄与している。
効率性	コスト全体に占める市の負担割合については適正である。

【観点別評価の一次・二次評価結果】

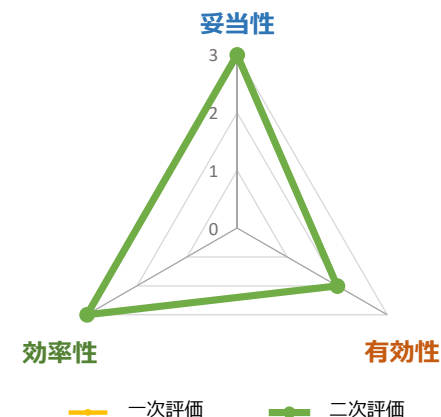

【事業の方向性に対する総合評価の目安】

事業の方向性	拡充			A,B	A	A,C
	維持			B,C	B	C
	縮小			B,C	C	C,D
	休廃止		D			
	完了	D				
		完了	皆減	縮小	維持	拡大

コスト投入の方向性

【成果・コストからみる事業の方向性】

成果	拡充	維持	縮小	休廃止	完了
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
コスト	拡大	維持	縮小	皆減	完了
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

事業の方向性に対する総合評価

B

【事業の方向性に対する総合評価の基準】

A【拡充】	成果向上のため事業の対象・目標・内容等を拡充・充実すべきもの
B【維持】	事業の対象・目標・内容等が適切で、事業の実施を維持すべきもの
C【要改善】	事業の対象・目標・内容等が適切でなく、見直し(縮小)の必要があるもの
D【完了または廃止】	事業完了または事業の廃止を検討するもの

【全体をととしての評価と今後の事務事業の方向性】

遊具等の価格高騰や利用者の要望を勘案し、幅広い年齢層の利用者が快適で安心・安全に利用できるよう整備を進めるとともに、利用者に向けた周知を徹底してください。また、遊具等の選定にも広く利用者の意見を取り入れながら、ニーズに沿った更新計画の見直しを期待します。
